



MUNICÍPIO DE LARANJAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PARECER TÉCNICO

REFERÊNCIA: Contrato 047/2022 – Tomada de preços nº01/2022 – Contratação por empreitada global de empresa para recape na rua Pernambuco trecho entre rua Dona Moça e São Caetano conforme projeto.

INTERESSADO: R.C CAMPOS FARIAS LTDA-ME; CNPJ 15.839.014/0001-70

ASSUNTO: Supressão de serviços.

A presente Obra, contempla recape na rua Pernambuco, de acordo com os serviços descritos em planilha orçamentária, dentre eles, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem superficial, calçadas e acessibilidades, reperfilamento em CBUQ (e=3,0cm), revestimento em CBUQ (e=3,0cm), sinalização de trânsito e travessia elevada. Durante a execução da obra foi constatado que não haveria necessidade de realizar os serviços de drenagem superficial (Assentamento de meio-fio) e calçadas em paver em alguns trechos da obra, tendo em vista que já constavam executados anteriormente e que apresentam boa qualidade, trazendo economia para o município. Projeto e memorial fotográfico em anexo.

Para adequação da planilha orçamentaria, de acordo com o que foi citado acima, foi realizado a supressão do quantitativo dos itens contratados de drenagem superficial e calçadas e acessibilidade, totalizando a redução do valor de R\$ **18.887,63R\$** correspondendo a **2,65%** do valor contratado inicialmente, onde os valores utilizados para compor os custos são os mesmo do contrato, portanto esse parecer é favorável sob os aspectos técnicos e de mensuração de valores para a concessão de supressão do valor contratual ao contrato 047/2022.

Sem mais para o momento,

Laranjal, 20 de março de 2023.


PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
Engenheiro Civil Crea-PR 168.345/D



MUNICIPIO DE LARANJAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA




MEMORIAL FOTOGRÁFICO



Handwritten signature

Rua Sergipe

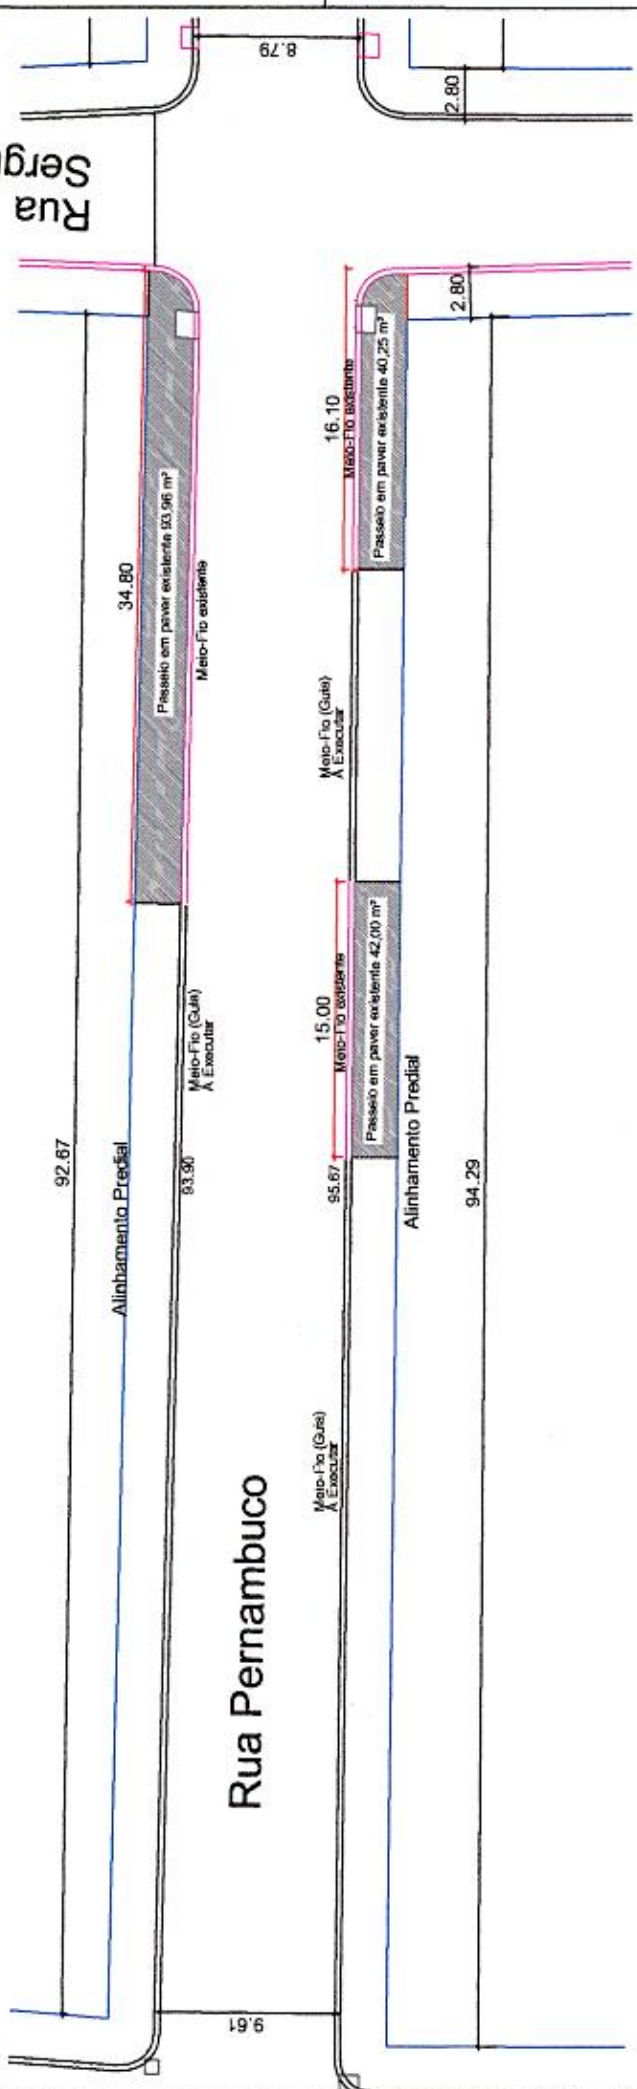

Rua Pernambuco

		MUNICÍPIO DE LARANJAL DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
SERVIÇOS GLOSADOS		PROPOSTA	
Nº DE PROJETO:	DATA:	Nº DE PROJETO:	DATA:
PROJETO DE PAVIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA PERNAMBUCO	01/01	01/01	01/01
Assinatura:		Assinatura:	
[Signature]		[Signature]	
Função: Engenheiro Responsável Técnico		Função: Engenheiro Responsável Técnico	
Registro nº: 10017/2008		Registro nº: 10017/2008	





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECAPE RUA PERAMBUCO							
LOCALIDADE SINAPI	03-22 (N DES.)	DATA BASE	03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERAMBUCO			MUNICÍPIO / UF	LARANJAL/PR	BDI 1	22,09%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERAMBUCO									
1.1. PLANILHA DE GLOSO RECAPE NA RUA PERAMBUCO									
1.1.1. DRENAGEM SUPERFICIAL									
1.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	66,00	44,89	BDI 1	54,81	3.617,21
1.1.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 5 CM*, AF_08/2017	M3	1,18	186,20	BDI 1	227,33	268,25
1.2.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE						15.002,17
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	176,00	2,35	BDI 1	2,87	504,96
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,80	105,14	BDI 1	128,37	1.129,62
1.2.3.	SINAPI	93693	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	890,00	0,77	BDI 1	0,94	827,28
1.2.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	176,00	58,36	BDI 1	71,25	12.540,30
									18.887,63
									3.895,46

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade:
Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

LARANJAL/PR
Local
sexta-feira, 17 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168 345/D
ART/RRT: 1720222872459
